

井控应急救援海南基地基础设施建设项目

# 水土保持监测季度报告

(第9期)

(2025年第4季度)

建设单位：海南中海石油码头有限公司

监测单位：博思百睿检测评价技术服务有限公司

二〇二五年十二月

## 目录

<b>1 项目水土保持监测季度报告表</b> .....	<b>1</b>
<b>2 生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表</b> .....	<b>3</b>
<b>3 水土保持监测情况</b> .....	<b>4</b>
3.1 水土流失影响因素监测 .....	4
3.1.1 地表扰动情况 .....	4
3.1.2 弃土弃渣 .....	4
3.2 水土流失状况监测 .....	5
3.2.2 水土流失量 .....	5
3.3 水土保持措施监测 .....	5
<b>4 阶段监测结论</b> .....	<b>8</b>
4.1 结论 .....	8
4.2 问题与建议 .....	8

## 1 项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2025年10月1日至2025年12月31日

项目名称	井控应急救援海南基地基础设施建设项目					
建设单位 联系人及 电话	廖继红	监测项目负责人（签字）： 	生产建设单位（盖章）			
填表人及 电话	18688591899	2025年10月1日	2025年12月31日			
主体工程进度	项目于2023年10月开工，计划2024年10月完工，延期至2025年12月完工。					
	指标	设计总量	本季度	累计		
扰动土地 面积 (hm <sup>2</sup> )	合计 (hm <sup>2</sup> )	1.21	0	1.21		
	建（构）筑物区	0.55	0	0.55		
	场内硬化区	0.56	0	0.56		
	景观绿化区	0.06	0	0.06		
	场外管线区	0.04	0	0.04		
	临时堆土区	0.25	0	0.25		
	施工生产区	0.05	0	0.05		
植被占压面积 (hm <sup>2</sup> )		0.10	0	0.10		
取土（石）场数量（个）		0	0	0		
弃土（渣）场数量（个）		0	0	0		
取土（石）量(万 m <sup>3</sup> )		0	0	0		
	指标	设计总量	本季度	累计		
水保措施	工程措施	雨水排水系统（套）	1	0	1	
		表土剥离（万 m <sup>3</sup> ）	0.03	0	0.03	
		表土回覆（万 m <sup>3</sup> ）	0.03	0	0.03	
	植物措施	景观绿化（m <sup>2</sup> ）	623.54	0	625	
		临时措施	临时拦挡（m）	200.00	0	200.00
			临时苫盖（m <sup>2</sup> ）	3300.00	0	3300.00
			排水沟（m）	545.00	0	515.00
			沉沙池（座）	3	0	3
洗车池（座）	1	0	1			
水土流失影响	降雨量(mm)		10月 934mm、11月 352.7mm、12月 47.7mm			
	最大 24 小时降雨(mm)		187.7			

因子	最大风速(m/s)	15.5		
	水土流失量 (t)	118.7	0.5	122.7
	水土流失灾害事件	无		
	监测工作开展情况	本季度开展 2 次现场调查监测		
	存在问题与建议	建议建设单位作好水保措施管护工作		

## 2 生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

表 2-1 生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

项目名称		井控应急救援海南基地基础设施建设项目		
监测时段和防治责任范围		2025 年第 4 季度, 1.12 公顷		
三色评价结论 (勾选)		绿色 <input checked="" type="checkbox"/> 黄色 <input type="checkbox"/> 红色 <input type="checkbox"/>		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动土地情况	扰动范围控制	15	15	未擅自扩大施工扰动范围
	表土剥离保护	5	5	本季度不涉及表土剥离
	弃土(石、渣)堆放	15	15	无违法乱丢乱弃的情况
水土流失状况		15	14	土壤流失量较小
水土流失防治成效	工程措施	20	19	已实施工程措施的阶段
	植物措施	15	15	植物措施已实施
	临时措施	10	9	临时措施已基本整改实施
水土流失危害		5	5	水土流失危害较轻
合计		100	97	

### 3 水土保持监测情况

我公司于 2025 年第 4 季度对项目主体工程区可能造成水土流失及水土保持实施情况进行了巡查监测，同时收集工程施工资料，现场调查结合工程施工进度资料进行整理分析、汇总，编写《井控应急救援海南基地基础设施建设项目水土保持监测季度报告》（2025 年第 4 季度），顺利完成本季度的水土保持监测工作。

我公司监测人员在监测过程中采取了重点调查与巡查监测相结合的监测方法，监测内容主要包括水土流失影响因素、水土流失状况、水土流失危害和水土保持措施等。重点监测工程区。

本季度主要施工部位为主体工程区主体建筑的建设，桩基施工全部完成，建构筑物主体工程施工已完成，正在进行装修施工及室外地面硬化施工。

#### 3.1 水土流失影响因素监测

##### 3.1.1 地表扰动情况

根据水保方案，本工程总扰动地表面积为  $1.21\text{hm}^2$ ，监测人员通过现场调查、结合遥感影像及项目总平面图，确认项目区扰动面积为  $1.21\text{hm}^2$ 。截至本季度末，工程建设累计扰动面积为  $1.21\text{hm}^2$ 。

##### 3.1.2 弃土弃渣

截至 2025 年 4 季度末，本项目土石方（含剥离表土）挖填方总量为  $7.34\text{万 m}^3$ ，其中挖方总量  $6.62\text{万 m}^3$ （含表土），填方总量  $0.72\text{万 m}^3$ （含表土），余方  $5.90\text{万 m}^3$  全部运至中海油服海南产业园建设项目进行综合利用，无弃方、弃渣产生。

## 3.2 水土流失状况监测

### 3.2.2 水土流失量

项目区所在区域的水土流失类型为水力侵蚀,目前项目正处于建设期,建设期开挖地、回填等人为活动干扰地表加速了水土流失。

通过监测点及监测点代表的监测分区和整个监测范围进行分析项目造成的土壤流失量,确定监测点侵蚀模数。由各监测点的地形地貌、植被覆盖度,结合简易水土流失观测场、监测点沟壑状况及沟道淤积状况和周边植被状况等,综合确定影响土壤侵蚀强度,分析、计算土壤侵蚀模数和土壤流失总量。得出本季度项目区产生的水土流失量为 0.5t。

## 3.3 水土保持措施监测


本季度我公司对工程建设区及周边可能造成的影响区水土流失及水土保持情况进行了巡查监测。本次对主体工程区开展了调查监测。监测分区水土保持工作详见表 3.3-1。

表 3.3-1 主体工程区水土保持措施情况表

主体工程区	
现状水土保持措施	根据现场踏勘,项目主体工程区已实施相关。
建议	建议建设单位作好水保措施管护工作

现场  
照片



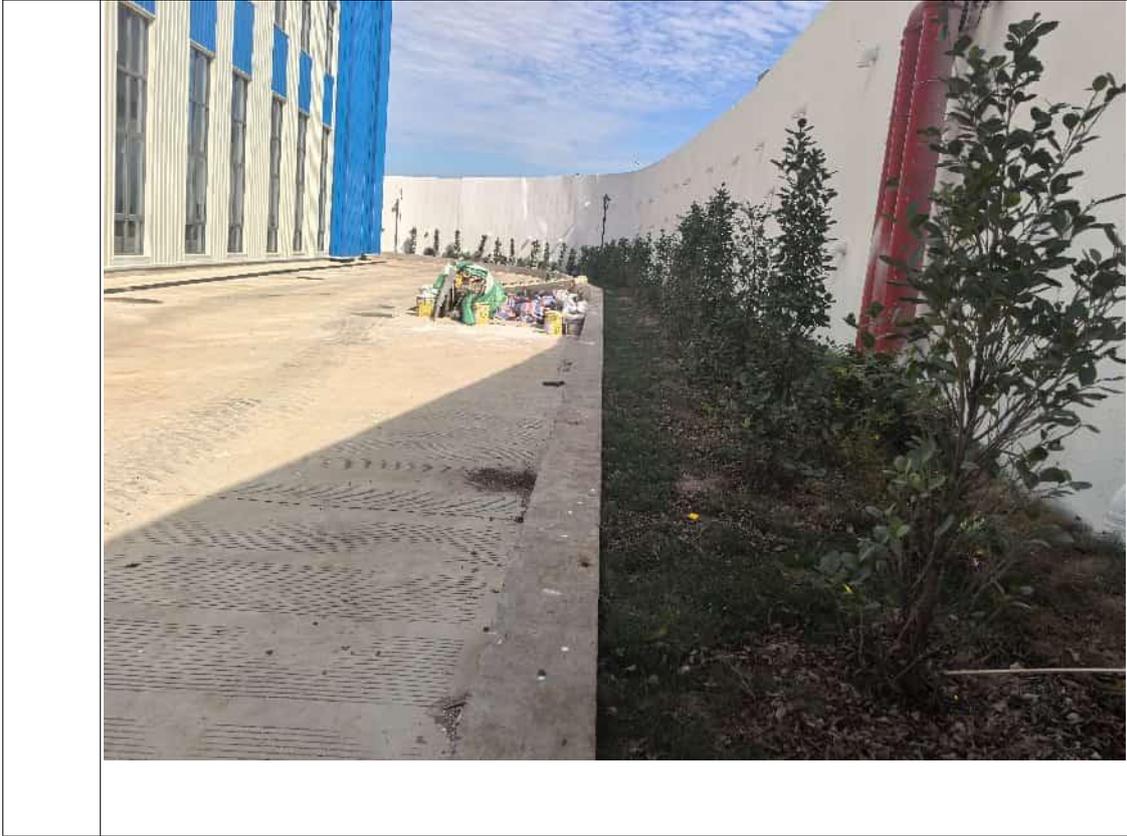

## 4 阶段监测结论

### 4.1 结论

通过现场监测分析，截至本季度末累计扰动面积约为 1.12hm<sup>2</sup>。本季度项目区土壤侵蚀强度以轻度为主，土壤流失量较小。

根据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号）要求，对本项目开展水土保持监测“三色”评价工作，本季度评价结论为“绿”色，三色评价指标及赋分表见附表一。

### 4.2 问题与建议

1、建议业主单位按项目设计要求继续关注相关水土保持措施。
